

Proposta Técnica e Comercial para Configuração do SAP ALM (Application Lifecycle Management) AdecoAgro Proposta nº 20260000230

25 de maio de 2026.

Conforme solicitado, apresentamos a proposta técnica e comercial para a configuração do SAP Cloud ALM (Application Lifecycle Management) na AdecoAgro, abrangendo os ambientes SAP S/4HANA atualmente em operação na organização e os processos de gestão do ciclo de vida que farão parte do escopo do projeto.

A AVN destaca-se pela excelência na entrega de soluções tecnológicas SAP. Contamos com uma equipe de profissionais altamente capacitados e experientes em SAP ALM, Solution Manager e SAP Cloud ALM, que aplicam metodologias de implementação homologadas pela SAP, assegurando elevados padrões de qualidade, eficiência e aderência às melhores práticas do mercado.

Estamos comprometidos em oferecer não apenas um serviço técnico de alto desempenho, mas também em estabelecer uma parceria sólida, estratégica e duradoura com a AdecoAgro, entregando uma plataforma de gestão do ciclo de vida SAP que proporcionará maior controle, rastreabilidade e maturidade operacional aos ambientes SAP da organização.

Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e prestar o suporte necessário em todas as etapas deste projeto. Agradecemos pela confiança em nossos serviços e pela oportunidade de colaborar para o sucesso da jornada SAP da AdecoAgro.

Atenciosamente,

Laerte Martins

Executive Director at AVN Tecnologia

+55 11 9.1705-1477

laerte.martins@avntecnologia.com.br

www.avntecnologia.com.br

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

O conteúdo desta proposta e seus anexos destinam-se exclusivamente à análise da AdecoAgro, não sendo permitida a sua divulgação a qualquer pessoa não envolvida no projeto a que esta proposta se destina ou a terceiros, sem a autorização prévia da AVN Tecnologia.

Todas as premissas assumidas na elaboração desta proposta são estritamente baseadas em informações fornecidas pela AdecoAgro. Quaisquer alterações que venham a ser realizadas no conteúdo das informações fornecidas, bem como a emissão ou publicação de quaisquer documentos que afetem direta ou indiretamente as premissas aqui referidas e definidas, implica em revisão pela AVN Tecnologia, dos termos e das condições aqui propostos.

Salvo por imposição legal, as informações contidas nessa proposta e em seus anexos não devem ser divulgadas fora da AdecoAgro e não podem ser duplicadas, usadas ou reveladas, no todo ou em parte, para qualquer propósito que não seja o de avaliação dessas informações pela AdecoAgro, ficando entendido que, se um contrato for celebrado pela AVN Tecnologia como resultado desta proposta, a AdecoAgro poderá duplicar, usar ou divulgar as informações conforme disposto no contrato. Esta restrição não limita o direito da AdecoAgro de usar as informações contidas nessa proposta quando tais informações tiverem sido obtidas de outra fonte sem restrição.

APRESENTAÇÃO

Ser um diferencial no mercado de TI é um desafio constante, e na AVN adotamos a filosofia de entregar sempre o melhor resultado aos nossos clientes. Combinamos profissionais altamente qualificados, ampla experiência de mercado e soluções personalizadas, alinhadas às necessidades e ao cenário de cada empresa, posicionando-nos como parceiros estratégicos e não apenas como fornecedores de serviços.

Somos especializados em soluções SAP, com sólida atuação em projetos de implementação, configuração, rollout, sustentação, melhorias contínuas, AMS e suporte técnico e funcional em ambientes S/4HANA. Nossa experiência abrange as principais áreas funcionais e técnicas da plataforma SAP, incluindo logística, supply chain, financeiro, controladoria, fiscal, compras, vendas, manufatura, warehouse management, integração de sistemas, desenvolvimento ABAP e soluções analíticas.

No contexto de SAP ALM (Application Lifecycle Management), contamos com profissionais especializados na administração e operação das ferramentas SAP Solution Manager e SAP Cloud ALM, apoiando empresas na gestão estruturada do ciclo de vida de suas soluções SAP. Nossa atuação em ALM abrange desde a configuração e administração das plataformas até a operação de processos críticos como gerenciamento de mudanças, governança de transportes, documentação de processos de negócio, monitoramento técnico de sistemas, gestão de testes e governança de projetos baseada na metodologia SAP Activate.

Com nossa ampla vivência em projetos SAP, atuamos de forma estruturada, segura e aderente às melhores práticas do mercado, permitindo que empresas de médio e grande porte ampliem sua eficiência operacional, suportem estratégias de crescimento e evoluam continuamente seus processos de negócio.

Na AVN, nosso compromisso é atuar em total alinhamento com a cultura organizacional e os objetivos estratégicos de cada cliente, independentemente do porte ou segmento de atuação. Nosso propósito é transformar os desafios de negócio em resultados concretos, apoiando nossos clientes com profissionais experientes, com atuação em empresas nacionais e multinacionais.

1. Configuração SAP Cloud ALM

O projeto abrangerá os principais módulos do SAP Cloud ALM, com foco em estruturar a governança, rastreabilidade e controle dos ambientes SAP S/4HANA da AdecoAgro, utilizando exclusivamente as funcionalidades nativas da plataforma (Clean Core).

a) Configuração e Administração da Plataforma

- Ativação e configuração inicial do tenant SAP Cloud ALM da AdecoAgro;
- Configuração do IAS para administração de usuários, perfis de acesso e autorizações.

b) Change Enablement

- Capacitação das equipes técnicas e funcionais nos novos fluxos de Change Enablement, abrangendo abertura, acompanhamento e aprovação de Change Requests.

c) Governança de Transportes (Transport Management)

- Configuração do módulo para governança, rastreabilidade e orquestração das Change Requests associadas aos transportes SAP; a execução permanece sob responsabilidade do STMS nos sistemas S/4HANA.

d) Gestão de Testes – Test Suite

- Criação de planos de teste para regressão, integração e UAT, com conteúdo fornecido pela equipe funcional da AdecoAgro;
- Execução dos ciclos de teste com registro de evidências e geração de relatórios nativos de cobertura e homologação.

e) Monitoramento – Health Monitoring e Real User Monitoring

- Configuração do monitoramento técnico, ativação do RUM e configuração de alertas proativos para disponibilidade, performance e falhas de integração.

f) Gestão de Projetos e Tarefas

- Criação e configuração do projeto no SAP Cloud ALM com marcos, entregáveis e integração com os demais módulos da plataforma.

g) Capacitação e Treinamento

- Capacitação de administradores e Key Users nas funcionalidades da plataforma, com elaboração de guias operacionais para suporte à operação autônoma das equipes.

h) Suporte Pós-Go-Live (Hypercare — 30 dias)

- Suporte remoto em horário comercial para estabilização da operação, atendimento a dúvidas, ajustes de baixa complexidade e registro de oportunidades de melhoria para priorização futura.

2. Etapas do Projeto

A configuração do SAP Cloud ALM será conduzida em fases estruturadas, alinhadas às melhores práticas SAP para ativação e configuração da plataforma.

a) Prepare Kick-off técnico com os stakeholders de TI e Basis, ativação do tenant, integração dos sistemas S/4HANA via LMS e alinhamento formal de escopo, premissas e cronograma.

b) Explore Sessões de validação com os stakeholders-chave para definição dos fluxos e indicadores por domínio ALM, com formalização das decisões que orientarão a fase Realize. Com prazo de 3 dias úteis ou prazo a ser acordado entre as partes, para retorno de validações e decisões por parte da AdecoAgro.

c) Realize Configuração técnica de todos os módulos definidos no Explore, incluindo Test Suite, Health Monitoring e RUM. A criação dos planos de teste está condicionada à disponibilização prévia dos processos pela equipe funcional da AdecoAgro.

d) **UAT — Homologação** Execução dos testes de aceite pelos usuários-chave da AdecoAgro com suporte da AVN, registro de evidências e aprovação formal como critério de entrada para o Deploy.

e) **Deploy** Validação e ativação das configurações no ambiente produtivo, execução do Go-Live com suporte da AVN e comunicação formal às áreas envolvidas, a ser elaborada pela AdecoAgro.

f) **Hypercare (30 dias)** Suporte remoto em horário comercial para estabilização da operação, orientação às equipes, ajustes de baixa complexidade e entrega do relatório final de configuração.


PLANEJAMENTO

3. Planejamento e Execução - Equipe e Governança de Projetos

O projeto será conduzido por um Consultor SAP Cloud ALM Sênior com cobertura integral dos domínios da plataforma e por um Gerente de Projetos com atuação Part Time ao longo de todo o projeto.

A governança será baseada em acompanhamento contínuo, gestão de riscos e controle de entregas, assegurando transparência e aderência ao cronograma.

A execução será realizada em estreita parceria entre as equipes da AVN e da AdecoAgro, sendo o engajamento ativo dos times de TI, Basis e consultores funcionais do cliente um fator crítico de sucesso para garantir que a plataforma configurada esteja plenamente aderente à realidade dos ambientes SAP e aos objetivos estratégicos do projeto.

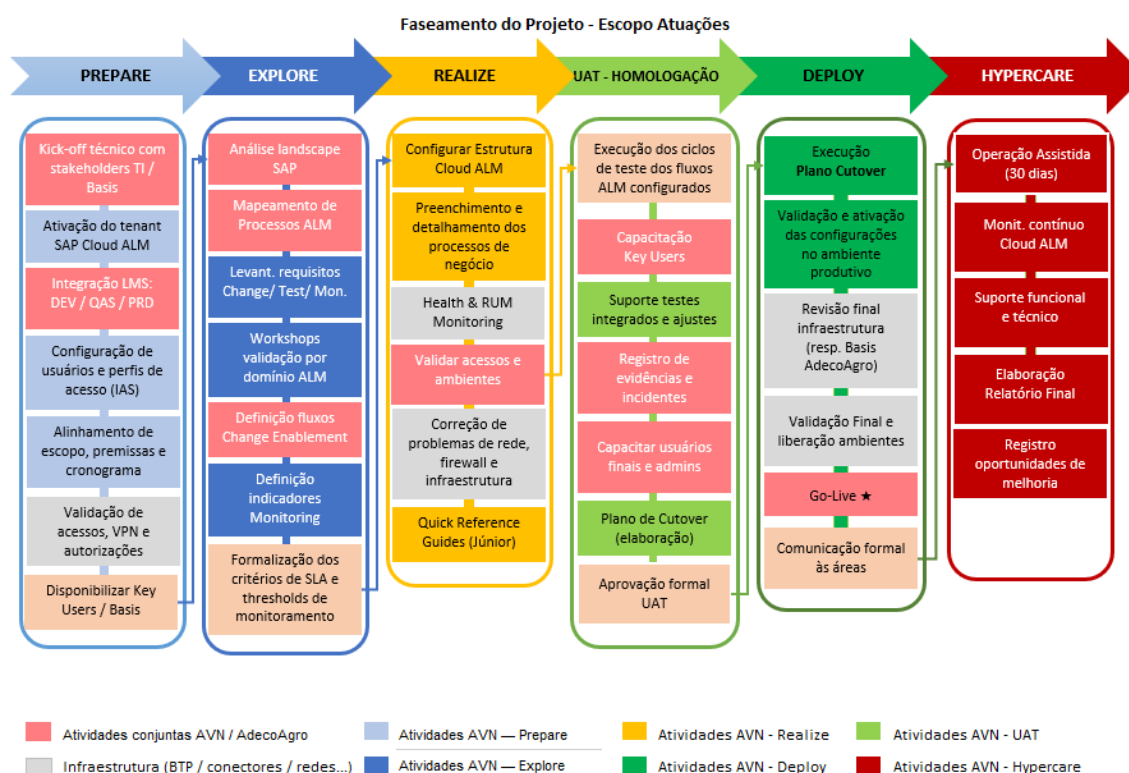

Premissas

Para garantir o sucesso do projeto e o cumprimento do cronograma, destacamos as premissas essenciais para ambas as partes:

- **Ponto Focal:** a AdecoAgro deverá nomear um Ponto Focal com autonomia decisória ou acesso ágil às lideranças, responsável pela coordenação interna das demandas e validações. Respostas às solicitações da AVN em até 3 dias úteis ou prazo acordado entre as partes.
- **Time de Basis:** disponibilidade estimada de 2 a 4 horas semanais nas fases Prepare e Realize para apoio nas integrações técnicas e validação de conectividade.
- **Licenças e Ambiente SAP:** licenças do SAP Cloud ALM ativas e ambientes S/4HANA (DEV, QAS e PRD) provisionados até a data de início do projeto.
- **Estabilidade dos Ambientes:** janelas de manutenção comunicadas à AVN com antecedência mínima de 48 horas.
- **Preparação para o UAT:** participantes com conhecimento operacional dos fluxos de Change Management, governança de transportes e gestão de testes antes do início da homologação.
- **Infraestrutura e Conectividade:** ajustes de rede, firewall ou infraestrutura fora do escopo do Cloud ALM são de responsabilidade da equipe Basis da AdecoAgro.
- **Gestão de Escopo:** demandas não contempladas nesta proposta serão formalizadas por meio de Change Order, com análise de impacto em prazo e custo antes da incorporação ao projeto.

EQUIPE DO PROJETO

4. Equipe do Projeto

O projeto será conduzido por dois profissionais, com as responsabilidades técnicas concentradas no Consultor Sênior e gestão proativa a cargo do Gerente de Projetos.

Consultor SAP Cloud ALM Sênior: Principal responsável técnico do projeto, cobrindo todos os domínios da plataforma:

- Configuração do tenant, administração de usuários e integrações via LMS;
- Configuração do Change Enablement, fluxos de aprovação e governança das Change Requests;
- Configuração do Test Suite, biblioteca de casos de teste e rastreabilidade;
- Seleção e ativação da biblioteca de processos de negócio (BPM);
- Ativação do Health Monitoring e RUM, configuração de alertas e dashboards;
- Capacitação dos Key Users e suporte ao Go-Live e Hypercare.

Gerente de Projetos – Part Time: Responsável pela proteção do cronograma e da qualidade das entregas:

- Gestão de cronograma, escopo, riscos e comunicação ao longo de todas as fases;
- Coordenação entre a squad AVN, Ponto Focal, Basis e áreas de negócio da AdecoAgro;
- Condução das reuniões de governança e reporte executivo aos Sponsors;
- Controle das atividades de UAT, Cutover, Go-Live e Hypercare.

GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

5. Governança e Comunicação

A governança do projeto será conduzida de forma estruturada e colaborativa, garantindo alinhamento contínuo, transparência na execução e acompanhamento efetivo de todas as etapas.

A estrutura de governança será organizada em dois níveis:

Reuniões Executivas - quinzenais: Conduzidas pelo GP com Sponsors e lideranças, com foco em status do projeto, evolução dos módulos, riscos, aprovações de fase e direcionamentos executivos.

Reuniões Operacionais - semanais: Conduzidas entre o Consultor Sênior, Ponto Focal e Basis, com foco no acompanhamento das atividades, resolução de impedimentos e alinhamento das próximas entregas. Sessões com Key Users serão agendadas pontualmente conforme a necessidade de cada fase, sem recorrência fixa.

A AVN atuará de forma proativa na gestão da comunicação e governança, promovendo transparência e alinhamento estratégico ao longo de todo o projeto.

MODELO DE EXECUÇÃO

6. Benefícios do Modelo de Execução

a) Senioridade Técnica Integral A cobertura de todos os domínios por um Consultor Sênior garante coerência entre os módulos, decisões mais ágeis e maior assertividade na resolução de dependências técnicas.

b) Gestão Proativa A atuação estruturada do GP garante controle contínuo de cronograma, escopo e qualidade, com identificação proativa de riscos e integração entre as equipes da AVN e da AdecoAgro.

c) Alinhamento e Transparência A comunicação contínua com Sponsors, Key Users e Basis assegura alinhamento permanente entre os objetivos estratégicos da organização e as entregas do projeto, com visibilidade clara sobre o status de cada módulo, riscos e marcos de entrega.

Com responsabilidade técnica unificada, gestão proativa e governança estruturada, a configuração do SAP Cloud ALM será conduzida de forma colaborativa, eficiente e aderente às necessidades da AdecoAgro.

7. Modalidade de Execução do Projeto

O projeto será executado integralmente em modelo remoto, com a equipe AVN atuando à distância ao longo de todas as fases, desde o kick-off até o encerramento do Hypercare.

As atividades de configuração, workshops de validação, sessões com Key Users e Basis, treinamentos e reuniões de governança serão conduzidas por meio dos canais de comunicação previamente acordados entre as partes, como Microsoft Teams ou outra ferramenta corporativa da AdecoAgro.

Este modelo garante agilidade na execução, centralização das informações e continuidade do projeto independentemente de deslocamentos, sem comprometer a qualidade das entregas ou o relacionamento com as equipes internas da AdecoAgro.

8. Despesas de Atuação Presencial — se aplicável

O projeto será executado integralmente em modelo remoto. Caso, por necessidade específica acordada entre as partes, seja necessária a atuação presencial de algum consultor, os custos relacionados serão de responsabilidade da AdecoAgro, incluindo hospedagem, alimentação, deslocamento (passagens, locação de veículos e transporte local) e demais despesas logísticas, seguindo a política interna de reembolso da AdecoAgro.

9. Suporte Remoto Pós-Go-Live

Após o Go-Live, será disponibilizado suporte remoto em horário comercial para garantir a estabilidade da plataforma e apoiar a consolidação dos novos processos pelas equipes da AdecoAgro.

Escopo do suporte:

- Atendimento a dúvidas e ocorrências relacionadas às configurações do SAP Cloud ALM;
- Ajustes corretivos de baixa complexidade; demandas de média ou alta complexidade serão tratadas como novo contrato de sustentação;
- Acompanhamento proativo via alertas e dashboards configurados durante o projeto;
- Orientação às equipes sobre Change Management, governança de transportes, Test Suite e monitoramento.

Disponibilidade:

- Atendimento em horário comercial via canais previamente acordados (e-mail, Teams ou ferramenta corporativa da AdecoAgro);
- Demandas críticas que impactem o fluxo de aprovação de Change Requests para o ambiente produtivo terão tratamento prioritário;
- Suporte fora do horário comercial disponível mediante aprovação prévia e consulta de valor/hora.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, FUNCIONAL

10. Documentação Técnica e Funcional

Como parte do projeto, será elaborada e disponibilizada documentação estruturada para garantir rastreabilidade, padronização operacional e suporte à continuidade e sustentação da plataforma.

a) Documentação Funcional Descrição dos processos de ALM configurados (Change Management, Transport Governance, Test Management, Process Documentation e Monitoring), fluxos operacionais, regras de aprovação das Change Requests, pontos de integração e registro das validações realizadas pelas equipes. O conteúdo relativo aos procedimentos de negócio será fornecido pela equipe funcional da AdecoAgro.

b) Documentação Técnica Registro das configurações realizadas nos módulos do SAP Cloud ALM, integrações via LMS, principais objetos técnicos, APIs e conectores configurados, perfis de acesso e evidências das alterações realizadas ao longo do projeto.

c) Documentação de Testes e Homologação Cenários e evidências dos ciclos de teste, registro das validações de UAT, controle de ajustes e aprovações, e evidências de Go-Live e estabilização da operação.

11. Itens Fora do Escopo

Para garantir clareza e alinhamento de expectativas, os itens abaixo não estão contemplados nesta proposta. Caso necessários, poderão ser avaliados e tratados conjuntamente mediante alinhamento prévio:

- Administração de infraestrutura, banco de dados, sistemas operacionais ou softwares de terceiros;
- Atividades nos sistemas SAP S/4HANA, incluindo upgrades, patches, SAP Notes ou Support Packages;
- Migração de conteúdo proveniente do SAP Solution Manager;
- Ativação de módulos do SAP Cloud ALM não contemplados nesta proposta, como Financial Operations e Intelligent Event Processing;
- Criação de diagramas de processo ou modelagem BPMN; o SAP Cloud ALM não possui essa funcionalidade nativa, ferramentas como o SAP Signavio são necessárias para esse fim;
- Sustentação contínua (AMS) ou suporte evolutivo após o encerramento do Hypercare;
- Gestão e renovação de licenças SAP Cloud ALM;
- Treinamentos adicionais ou novas turmas além das sessões previstas nesta proposta.

Eventuais necessidades adicionais identificadas durante o projeto poderão ser avaliadas conjuntamente e formalizadas por meio de revisão de escopo ou nova proposta comercial.

GERAL

12. Responsabilidades da AdecoAgro

Para o bom andamento do projeto, a AdecoAgro se compromete a:

- Disponibilizar informações, acessos e definições necessárias em até 3 dias úteis após solicitação ou de conforme prazo acordado entre as partes, incluindo acesso aos sistemas SAP S/4HANA e ferramentas de integração;
- Garantir a participação dos profissionais-chave nas etapas de validação, testes, treinamentos e Go-Live, especialmente o time de Basis para as integrações técnicas;
- Assegurar que os participantes do UAT possuam conhecimento básico de navegação SAP e dos conceitos de ALM, Change Management e governança de transportes;
- Disponibilizar infraestrutura, conectividade e acesso VPN aos ambientes SAP quando necessário;
- Apoiar ativamente os ciclos de testes e aprovações, garantindo que atrasos não impactem o cronograma de Go-Live;
- Participar das reuniões de governança conforme cadência definida e realizar validações e aprovações em até 3 dias úteis após solicitação formal ou de conforme prazo acordado entre as partes.

13. Premissas Gerais

As premissas abaixo estabelecem os parâmetros utilizados para definição do esforço, prazo e composição dos valores desta proposta.

- O projeto será conduzido de forma colaborativa, com envolvimento ativo dos times de TI, Basis e consultores funcionais da AdecoAgro;
- A AdecoAgro deverá designar um Ponto Focal com autonomia decisória, especialmente para definições relacionadas aos fluxos de Change Management e governança de transportes;
- Licenças do SAP Cloud ALM ativas e ambientes SAP provisionados antes do início das atividades, pré-requisito crítico para o cronograma;

- Ambientes S/4HANA (DEV, QAS e PRD) estáveis durante o projeto; janelas de manutenção comunicadas com mínimo de 48 horas de antecedência;
- Projetos SAP concomitantes que possam impactar ambientes ou o time de Basis deverão ser comunicados previamente à AVN;
- Alterações de escopo tratadas por meio de Change Order formal, com avaliação de impacto em prazo e custo antes da incorporação ao projeto;
- Migração de conteúdo do SAP Solution Manager não está contemplada nesta proposta e será tratada como demanda adicional.

O atendimento destas premissas é essencial para garantir previsibilidade, controle e eficiência na condução do projeto.

CRONOGRAMA


14. Cronograma Geral

O projeto será executado conforme cronograma abaixo, contemplando todas as fases de configuração até o encerramento do Hypercare.

O prazo reflete a natureza transversal da plataforma, que abrange múltiplos domínios, Change Management, Transport Governance, Test Suite, Process Documentation e Monitoring, além das integrações com os sistemas SAP S/4HANA, que exigem coordenação contínua entre as equipes.

O início formal será definido em comum acordo após o aceite desta proposta, condicionado à disponibilidade do ambiente SAP, à montagem da equipe do projeto e das licenças SAP Cloud ALM pela AdecoAgro.

Cronograma:

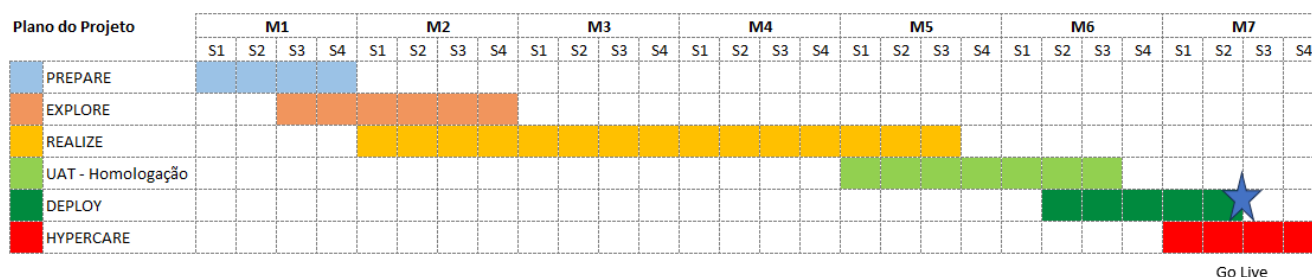

15. Investimento Previsto, Condições de Faturamento e Validade da Proposta

O valor previsto para o projeto, considerando todas as etapas, atividades e serviços descritos nesta proposta técnico-comercial, será de: **R\$ 658.936,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais)** já inclusos todos os tributos.

Os valores apresentados contemplam as atividades de configuração dos módulos do SAP Cloud ALM, integração com os sistemas SAP S/4HANA, suporte ao Go-Live, Hypercare, documentação técnica e funcional, governança e acompanhamento do projeto, conforme escopo definido nesta proposta.

Condições de Faturamento

O faturamento do projeto será realizado em 7 (sete) parcelas mensais, correspondentes a aproximadamente 14,28% do valor total da proposta cada uma, alinhadas ao cronograma de execução do projeto.

Cada faturamento será realizado mediante aprovação do racional de atividades e evolução do projeto enviado pela AVN, contemplando as entregas e atividades executadas no período correspondente, incluindo o status de configuração dos módulos do SAP Cloud ALM, marcos concluídos e evidências das entregas realizadas.

Após a aprovação, a emissão da nota fiscal ocorrerá até o dia 10 do mês subsequente à execução dos serviços.

Validade da Proposta

Esta proposta possui validade de 30 dias a partir da data de sua emissão, podendo ser revisada após este período em função de alterações de escopo, premissas, disponibilidade de recursos, disponibilidade do ambiente SAP ou condições comerciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

16. Confidencialidade

A AVN tratará como estritamente confidenciais todas as informações, dados, documentos, arquivos, planilhas, apresentações, imagens e demais materiais aos quais tiver acesso em razão desta proposta e da execução dos serviços, incluindo informações relacionadas ao projeto e à operação da AdecoAgro.

Fica expressamente vedada qualquer forma de divulgação ou compartilhamento dessas informações sem prévia e formal autorização da contratante, sob pena de responsabilização por eventuais perdas e danos.

A obrigação de confidencialidade permanecerá válida durante toda a execução do projeto e após o encerramento contratual.

17. Garantia

A garantia estará vigente durante o período de Hypercare. Correções relacionadas a falhas nas configurações realizadas pela AVN serão tratadas sem custos adicionais.

Estão fora da garantia demandas de alteração de escopo, mudanças de processo ou solicitações evolutivas, bem como situações fora do controle da AVN, como modificações realizadas por terceiros, alterações de processo pela AdecoAgro pós-Go-Live ou atualizações aplicadas pela SAP na plataforma.

Após o encerramento do Hypercare, solicitações adicionais serão tratadas como novas demandas mediante contrato de sustentação ou proposta específica.

18. Termo de Autorização de Uso de Imagem Institucional

A CONTRATANTE autoriza expressamente a utilização, pela CONTRATADA, de seu logotipo, imagem institucional, release e informações relacionadas ao projeto para fins exclusivamente institucionais e comerciais da AVN.

A divulgação poderá ocorrer em materiais institucionais, apresentações corporativas, website, portfólio, folders, propostas comerciais e demais meios de comunicação, em território nacional e internacional.

Esta autorização é concedida de forma gratuita, sem qualquer ônus, permanecendo restrita à divulgação institucional da parceria e dos serviços prestados.

ACEITE

19. Declaração de Aceite

Declaramos nosso total acordo com os termos apresentados nesta proposta comercial, bem como pleno conhecimento de seu conteúdo e condições.

Com base nas especificações técnicas e comerciais aqui descritas, autorizamos formalmente a execução dos serviços contemplados nesta proposta.

20. Formalização da Proposta

A AVN declara possuir qualificação técnica e experiência na prestação dos serviços descritos nesta proposta, comprometendo-se a executá-los com qualidade, confidencialidade, independência técnica, ética e profissionalismo.

A AVN também declara que utilizará profissionais devidamente capacitados e qualificados para execução das atividades previstas no projeto, com expertise comprovada em SAP Cloud ALM, garantindo aderência às melhores práticas SAP durante todas as fases da configuração.

A data de início das atividades será definida em comum acordo entre as partes após o aceite formal desta proposta, condicionada à disponibilidade do ambiente SAP e das licenças SAP Cloud ALM pela AdecoAgro.

As empresas abaixo relacionadas assinam esta proposta, concordando com as condições técnicas e comerciais aqui apresentadas.

São Paulo, 25 de maio de 2026.

AVN TECNOLOGIA

CNPJ: 47.975.530/0001-19

ADECOAGRO

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
